

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๑๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กลุ่มคำร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๘๑-๘๓ ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายนันทวิทย์ ชยะกุล คีรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ขอยขยายกร ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ขอยขยายกร ๓๔ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๓ แบบแปลนเทศบาล ช.๘๔/๖๕	จำนวน ๘ หน้า
ผนวก ๔ หลักประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า




ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิตย์ คุณผล)




(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายนันทวิทย์ ชยะกุลคีรี)

 ๒๕ มิ.ย. ๖๗

ฉบับ

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๐๐๖๔๗๑๕๓๒๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๗,๗๗๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๓๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หก ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๑๕,๗๘๐.๓๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาจ่ายเป็นเงินเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๓ งวด ระยะเวลา ๑๕๐ วัน ดังนี้ ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสิน



.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๘,๘๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒๐ ชุดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๗ ชุดแล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๔,๔๒๕.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑๖ บ่อแล้วเสร็จ
- งานปรับผาดตะแกรง ๒๐ ชุด
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๒,๒๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานปรับผาดตะแกรงส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ
- และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ ข ๙๔/๖๕ แล้วเสร็จ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ -

ของเงินค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายฉัตรวิทย์ ชยะกุลศิริ)



ต้นฉบับ

-๔-

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) หรือ ๕.๕ แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้





ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)





ผู้รับจ้าง

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๕-

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๖-

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีกรบอกละเมิดสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกละเมิดสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง หรือแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน





ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)





ผู้รับจ้าง

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๗-

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิด จากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้ง สิ้นสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประกันภัยประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานผู้รับประกันภัยประนีประนอมให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๘-

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๙-

ค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๕,๘๘๘.๗๕ - บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมามีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยทันทีภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้อง



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง



(นายันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

-๑๐-

ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่

จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลคีรี)

ต้นฉบับ

-๑๑-

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาคีวิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน





(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ)



(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

-๑๒-

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส)ทางด้าน การก่อสร้าง โยธา สํารวจ หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

หมวดงานทาง

๑. งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Lt/Lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๒. งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อกัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 Lt/Lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)




ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๑๓-

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



ผู้รับจ้าง

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนพคุณ เดชเสน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๑๔๔๓๙๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๑๐๒๒๐๐๖๔๕๓

ต้นฉบับ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า กลุ่มคำร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง โดย นางสาวพรทิพย์ พรหมบุตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบายน้ำ ซอยชยางกูร ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปราคาละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาคำนี้เป็นระยะเวลา ๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกรับคำเสนอใบ เสนอได้ก็ได้อีกก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าขอให้นำเทศบาลนครอุบลราชธานี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ใหม่ก็ได้

ข้าพเจ้าขอรับว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีคุณสมบัติที่จะรับคำสั่งซื้อใบนี้ หรือใบเสนอราคาแบบแปลนประกอบสัญญาเลขที่ ทน.อป..... ราคาในใบรวมทั้งหมดต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. (เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา) ข้าพเจ้าขอเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



๓๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕:๒๗:๔๐ น.

(นางสาวพรทิพย์ พรหมบุตร)
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๔๑๔๓๓๗
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๙๑๐๐๑๔๔๔๐
รหัสอ้างอิง OTR ๐๗๐๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี D๘๘๘๖๖๖๖๐๘๕๕๗



เปลี่ยนแปลงประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 13/2๕๖7
วันที่ 24 ต.ค. 2566

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



ประมูล

การก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ
ขอยขยงกร 34 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้ว่าจ้าง
วันที่เสนอราคา

เทศบาลอุบลราชธานี
หจก.เข็ดชัยสินรุ่งเรือง
เทศบาลอุบลราชธานี
11 กันยายน 2566

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน
1	1.ระบบระบายน้ำ 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEPAVEMENT)	ตร.ม.	3,790.00	150.00	568,500.00
2	1.2 งานโครงสร้างSTRUCTURES) 1.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.6 ม.	ม.	250.00	1,500.00	375,000.00
3	1.2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	379.00	1700	644,300.00
4	1.3 งานเบ็ดเตล็ด(MISCELLANEOUS) 1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 1.3.1.1 บ่อรับน้ำสำหรับท่อ ระบายน้ำตก.0.60 ม.	ชุด	24.00	10,311.53	247,476.72
5	1.3.1.2 บ่อรับน้ำสำหรับท่อ ระบายน้ำตก.1.00ม	ชุด	30.00	15,835.96	475,078.80
6	1.3.1.3 งานปรับระดับบ่อพักน้ำ (พร้อมทาสีฝาตะแกรงเหล็ก เดิม)	ชุด	50.00	1,449.74	72,487.00
7	2. งานผิวทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นรอง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทาง คอนกรีต(MATERIALS TO CONTROL PUMPINGUNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.2 งานรองพื้นทางลูกรัง (SOILAGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	189.50	500.00	94,750.00



ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.12/2567
24 ต.ค. 2566



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

(Handwritten signature)

		ต้นฉบับ		
2.1.2.1 งานรองพื้นทางลกรัง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	368.00	324.05	141,858.00
2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETEPAVEMENT)				
2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม. 9 (PORTLAND CEMENT CONCRETEPAVEMENT) (ใช้ตะแกรง เหล็ก)	ตรม	3,790.00	476.00	1,804,040.00
2.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตาม ขวาง (EXPANSION JOINT) 10	เมตร	56.00	300.00	16,800.00
2.2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 11	เมตร	557.00	150.00	83,550.00
2.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 12	เมตร	588.00	100	58,800.00
2.2.2 ค่าขั้วค้ำหน้าผิวคอนกรีต 13	ตร.ม.	3790.00	80.00	303,200.00
3. งานป้ายโครงการ				
3.1 ป้ายโครงการ 14	ชุด	1.00	3360.00	3,360.00
				4,889,200.52

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงิน 4,889,200.52
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าภาษี 1.3 1,466,760.16
 รวมเป็นเงิน 6,355,960.68

ปรับราคาเพื่อให้เหมาะสมในการเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,355,960.68

ลงชื่อ

C

(นายบัณฑิต ษยะกุลศิริ)



ผู้มีอำนาจลงนาม คือ การเข้าร่วมของพันธมิตรและห้างหุ้นส่วนจำกัด เข็ดชัยสินรุ่งเรือง



หนังสือประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 13/2567
 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2566
 (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....





ต้นฉบับ

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100064719321

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนขางกูร อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนน ขยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย น.ส. ชิตชนก ราชอุดม และ น.ส. สุมาลี นิมดอนทอง ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดัง มีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำขอยขยางกูร 34 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลข ที่ ทน.อบ.13/2567 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็น จำนวนเงิน 317,775.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่า ทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 317,775.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำ ประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น


ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ



ลงลายมือชื่อ



พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส. สุมาลี นิมดอนทอง)

ผู้คำประกัน

(น.ส. วรัญญา ชมชื่น)

พยาน

มอบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 13/2567

ลงวันที่ 24 ต.ค. 2566

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



การยืนยันหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้องค์การจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 4777 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000252086-1 :-

EFF_C_1_PLUS

Issue/Review by K CONNECT-LG

2595707

K-Contact Center 02-8889888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00010/67

(สำเนา)

วันที่ 7 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เข็ดชัยสินรุ่งเรือง

81-83 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยขยงกรู 34 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนขยงกรูอุบลราชธานี เลขที่ 100064719321 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566	2208010101.001	317,775.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.13/2567(CNTR-01506/67)
	รวมเงิน		317,775.00	
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หลักฐานการรับหนังสือกำกับ

เลขที่ CB-00010/67

วันที่ 7 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็ดชัยสินรุ่งเรือง

81-83 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยขบางกร 34 เป็นหนังสือกำกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนขยางกรอุบลราชธานี เลขที่ 100064719321 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566	2208010101.001	317,775.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.13/2567(CNTR-01506/67)
รวมเงิน			317,775.00	
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือกำกับ





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100064719321

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนขางกูร อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนน ขยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย น.ส. ชิตชนก ราชอุดม และ น.ส. สุมาลี ฉิมดอนทอง ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดัง มีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เข็ดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำขอยขยางกูร 34 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลข ที่ ทน.อบ.บ.13/2567 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็น จำนวนเงิน 317,775.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่า ทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 317,775.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำ ประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส. ชิตชนก ราชอุดม)



(น.ส. สุมาลี ฉิมดอนทอง)

ผู้คำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นาง สุชาดา หลีวรรณกุล)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส. วรัญญา ชมชื่น)

พยาน

การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปถึง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000252086-1 :-

EFF_C_1_PLUS

Issue/Review by KCONNECT-LG
2595707

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายการ ๓๔

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายการ ๓๔ ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ. ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินในการก่อสร้าง ๖,๓๕๕,๕๐๐.-บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีกลุ่มคำร่วมห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน และห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็ดชัยสินรุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้างตามรายการต่อไปนี้

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๘,๘๗๕.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒๐ ชุดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๗ ชุด แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๔,๔๒๕.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑๖ บ่อ

แล้วเสร็จ

- งานปรับผาตะแกรง ๒๐ ชุด
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตรม. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๒,๒๐๐.-บาท ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้


- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานปรับผาตะแกรงส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ
- และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ ข ๙๔/๖๕ แล้วเสร็จ


และเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงาน


//-๒-บัดนี้..

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายกรุง ๓๔
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และคณะกรรมการ
ได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และ
งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้กับกลุ่มความร่วมมือทางหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน และทางหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง
เป็นเงินจำนวน ๖,๓๕๕,๕๐๐.-บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษณุ สุระชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปัญญา ทองสรรค์)

วันที่..... 18 มี.ค. ๒๕๖๗
ใบตรวจรับงานนี้
ได้ลง พ.ต..... 142-67-1499

(นางสาวจันทร์ลักษณ์ นามบุญ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

มอบหมายให้

กิจการค้าร่วมห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน

๘๑ - ๘๓ ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๖.๑๖๗

เลขที่ CCSP-ขยายการ๓๔-๐๖ (ลงชื่อ) ๘๖๗ 169 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 14 มี.ค. 2567 113 มี.ค. 2567 15.23%

อ้างถึง สัญญาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายการ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ กิจการการค้าร่วมห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน เป็นผู้รับจ้างทำงานกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายการ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ ทางกิจการค้าร่วมฯ ได้ดำเนินก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายการ ๓๔ เสร็จตามรูปแบบรายการโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๘,๘๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒๐ ชุด แล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๗ ชุด แล้วเสร็จ
 - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

- งวดที่ ๒** ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๔,๔๒๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑๖ บ่อ แล้วเสร็จ
 - งานปรับฝาดตะแกรง ๒๐ ชุด
 - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

- งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)** ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - งานปรับฝาดตะแกรงและงานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ ข ๙๔/๖๕ แล้วเสร็จ

ทางกิจการค้าร่วมฯ ขอเรียนมาเพื่อโปรดนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างของทางห้างฯด้วย เมื่องานก่อสร้างถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการในสัญญาจ้างทุกประการและขอได้โปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับทางกิจการค้าร่วมฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๓๕๕,๕๐๐ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

C

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)





คำสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ที่ ๓๓๖ /๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ
ซอย ชยางกูร ๓๔

ตามที่ คำสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ๘๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวด
ราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร ๓๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นายนพคุณ เดชเสน | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิษณุ สุระชัย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายปัญญา ทองสรรงค์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการดังกล่าว ดังนี้

เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| ๑. นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์ | ผู้อำนวยการส่วนการโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิษณุ สุระชัย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายปัญญา ทองสรรงค์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอาทิตย์ คุณผล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

	ปลัดเทศบาล
	รองปลัดเทศบาล
	นายกสภาเทศบาล
	คณะกรรมการบริหารงานการคลัง
	คณะกรรมการควบคุมและป้องกัน
	ผู้บังคับการ



คำสั่ง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ที่ ศ๒๕/๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ขอยชยางกูร ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ขอยชยางกูร ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ขอยชยางกูร ๓๔ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ๑.๑ นายวัฒนา สมลา | ประธานกรรมการฯ |
| หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | |
| ๑.๒ นางสาวอรรmani เชลลง | กรรมการ |
| นักจัดการงานทั่วไป | |
| ๑.๓ นางณัฐทิยา ศรีไชย | กรรมการ |
| ลูกจ้างประจำ | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวัน

เสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๑ นายนพคุณ เดชเสน

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

๒.๒ นายวิษณุ สุระชัย

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒.๓ นายปัญญา ทองสรรค์

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งส่งมอบงาน

๓. ผู้ควบคุมงาน

๓.๑ นายวชิรณพพงษ์ ลิ้มปิติปราการ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๓.๒ นายศานิต ทองกลม

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘


สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอาทิตย์ คุณผล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 วันที่ 7 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)
 เจ้าหน้าที่ นางสาว จุฬารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ (./Default.aspx?menu=088D6D79-
 หน้า D5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)
 หน่วย
 งาน
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(Default.aspx)

อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS
 ระบบงบประมาณ

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

7 เมษายน 2567[V.2024-03-07141.15]

รายงาน ()
 ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

- การรับเงินที่เป็นรายรับ ()
- การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()
- จัดทำใบนำส่งเงิน ()
- สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 66089144397
 เลขคณสัญญา(e-GP)* 661022006453
 เลขที่คณสัญญาของ อปท.* ทน.อบ.13/2567
 วันที่ทำสัญญา* 24/10/2566
 วันสิ้นสุดสัญญา* 22/03/2567
 เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS
 เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-01506/67
 ชื่อเจ้าหน้าที่* หัวหน้าส่วนจำกัด เขตชัยสิริรุ่งเรือง

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง	6,355,500.00	บาท
จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง	6,355,500.00	บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	6,355,500.00	บาท

- ระบบข้อมูลรายจ่าย
- สร้างโครงการเงินสะสม ()
- จัดซื้อจัดจ้าง ()
- บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()
- บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()
- จัดทำฎีกา ()
- กัน ()
- สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ขอยชยงูร 34	เงินงบประมาณ	ค่างจ่าย	6,690,000.00	6,355,500.00	334,500.00
						6,355,500.00	

- ระบบบัญชี
- รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()
- ทะเบียนสินทรัพย์ ()
- การบริหารระบบ
- การจัดการฐานข้อมูล ()

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา



เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวจุฬารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณค่างจ่าย 2565 : โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ขอยชยงูร 34	6,355,500.00	0.00	6,355,500.00



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

เจ้าหน้าที่ นางสาว จุฬารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-หน้าที่ D5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย
งาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(Default.aspx)

อปท. นี้ล่างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

7 เมษายน 2567[V.2024-03-07141.15]

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

บันทึก ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

เลขที่โครงการ(e-GP)	66089144397
เลขคณสัญญา(e-GP)*	661022006453
เลขที่คณสัญญาของ อปท.*	ท.น.บ.13/2567
วันที่ทำสัญญา*	24/10/2566
วันสิ้นสุดสัญญา*	22/03/2567
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	
เลขที่สัญญา(e-LAAS)	CNTR-01506/67
ชื่อเจ้าหน้าที่*	นางหิรัญญา จันทร์...

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง	6,355,500.00	บาท
จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง	6,355,500.00	บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	6,355,500.00	บาท

สถานะ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ขอยขยฯ งกร 34	เงินงบประมาณ	ค่างจ่าย	6,690,000.00	6,355,500.00	334,500.00
						6,355,500.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา*

ชื่อผู้จัดทำ*

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณค่างจ่าย 2565 : โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ขอยขยฯ งกร 34	6,355,500.00	0.00	6,355,500.00

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00010/67

(สำเนา)

วันที่ 7 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสิน รุ่งเรือง

81-83 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยขยางกูร 34 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนขยางกูรอุบลราชธานี เลขที่ 100064719321 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566	2208010101.001	317,775.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.13/2567(CNTR-01506/67)
		รวมเงิน	317,775.00	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

3

ต้นฉบับ



โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยชัชชางกูร 34



เทศบาลนครอุบลราชธานี

ฉบับแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 13/2564
ฉบับที่ 24 ต.ค. 2565

(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....	พยาน
(ลงชื่อ).....	พยาน





อำนาจผู้ต้อง

 (นางสาวอรุณมาลี เพลอง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนน ศ.ส.ส. และระบบระบายน้ำ ซอยช่างคูรี 34

ต้นฉบับ

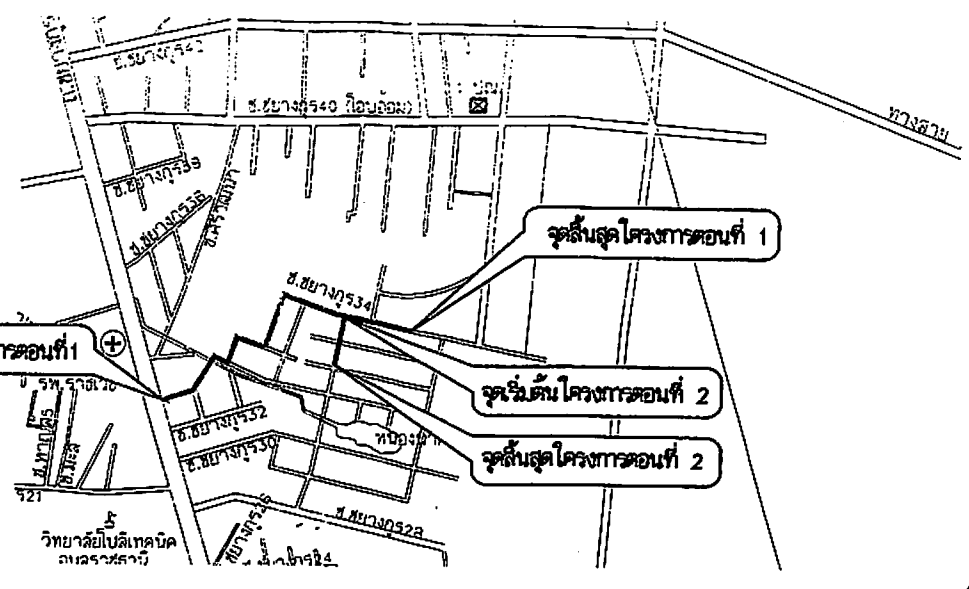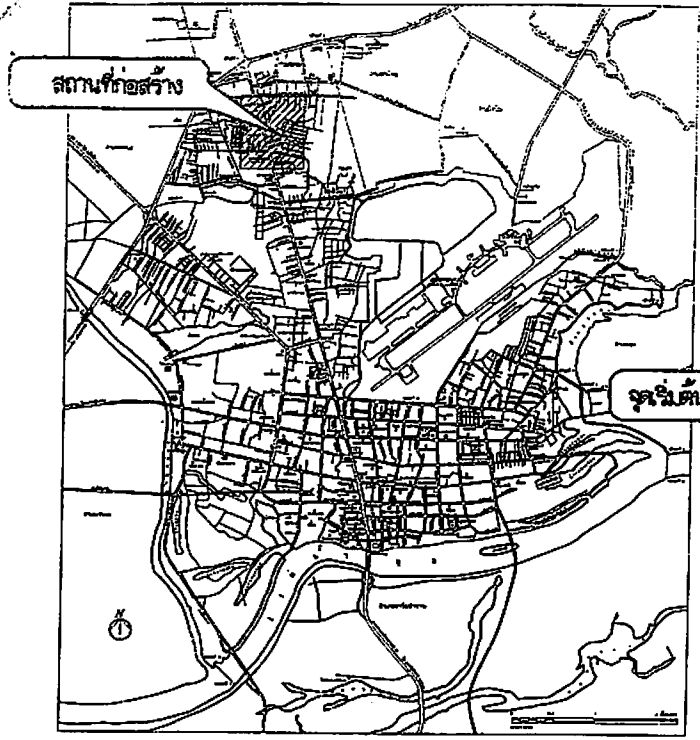

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ก่อนนำดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจบริเวณก่อสร้างแล้วทำ SHOP DRAWING เพื่อหาปริมาณงานรวมทั้งเขตที่ก่อสร้างได้จริง หรือทั้งสำรวจค่าระดับของงานวางท่อที่นำมาทำถนนและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุเพื่อพิจารณาทั้งในคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุสามารถจะปรับค่าระดับและตัดส่วนปริมาณงานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือปริมาณงานรวมเป็นหลัก
2. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 บัญชี เครื่องหมายแสดงราคาก่อสร้างเป็นเครื่องหมายกำหนดราคา บัญชีแสดงมูลค่าเงิน, บัญชี เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุขณะก่อสร้าง ค่าที่ช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุกำหนด
3. งานสำรวจความลึกของพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง เช่น คูน้ำ, หิน, หลุมดิน ถ้ำดินหรือดินอ่อนให้ผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายไปที่สถานที่ ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ เว้นแต่ข้อกำหนดในแบบแปลนกำหนดให้ไว้ที่สุราษฎร์
4. วัสดุหินเสริมคอนกรีต, ท่อระบายน้ำ, วัสดุ, งบประมาณเหล็กสำเร็จรูป และวัสดุอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนก่อสร้างว่าได้มีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบ และมีสำเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนออย่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุเพื่ออนุมัติก่อน จึงสามารถนำมาก่อสร้างในโครงการได้ โดยค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมของวัสดุ กำหนดไว้ในรายการแบบมาตรฐานก่อสร้าง
5. การก่อสร้างรั้วเป็นร่องพื้นทางและพื้นทาง... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...ตรวจสอบควบคุมของปริมาณแบบก่อสร้างกำหนด เพื่อให้เป็นคำอ้างอิงในการตรวจสอบรับพัสดุต่อไป... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...จุดตรวจขนาด 100 เมตร หรือตามจุดที่มีของช่างควบคุมงานที่เห็นว่าจำเป็น ผลการตรวจสอบรับพัสดุ... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...โครงการทั้งหมดนี้... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...โดยช่างควบคุมงานที่กำหนดให้ 7.5 ซม. + 2.5 ซม. ... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...ขนาด 100 เมตร เพื่อให้นำไปตรวจสอบควบคุมปริมาณมาตรฐานวัสดุ โดยช่างควบคุมงาน... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...ผลการตรวจสอบรับพัสดุ... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...โดยช่างควบคุมงาน... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...ได้ปริมาณไว้... (ส่วนนี้ถูกตัดขาดและทับด้วยตราประทับ) ...



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง
วันที่ วันที่ วันที่

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง



ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ถนนขี้เหล็ก

- A = บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.50 ม.
- B = บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 ม.
- C = บริเวณคันดินบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าระแนงเหล็กของเดิม

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.50 ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 ม.

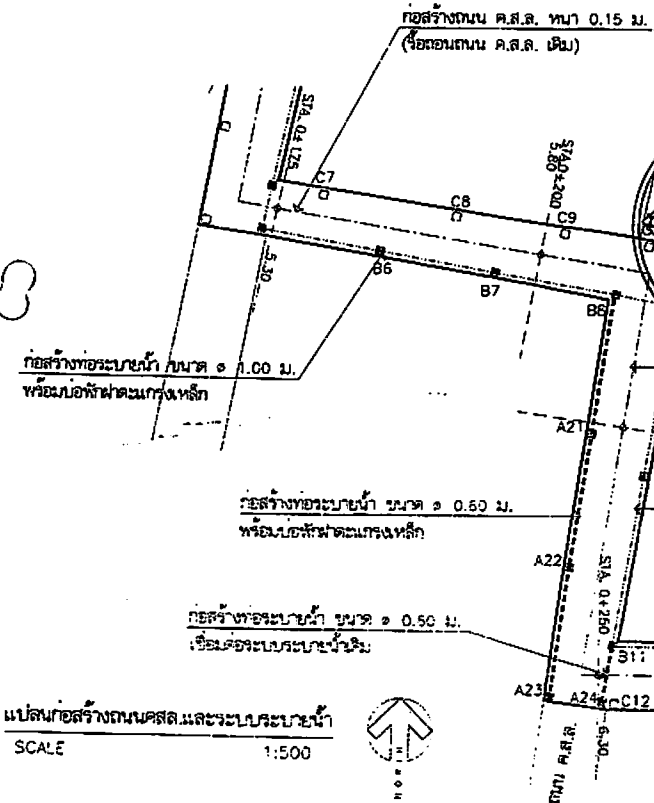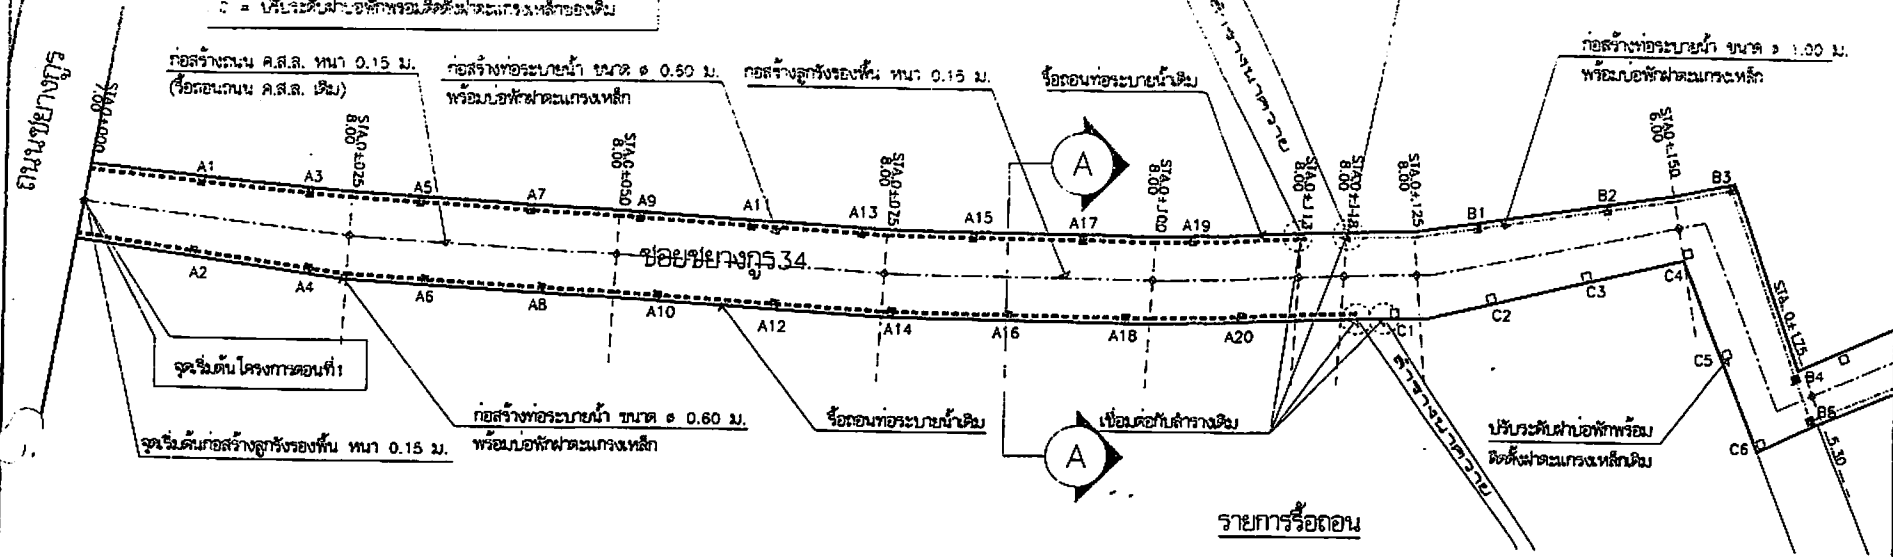

รายการรื้อถอน


1. รื้อถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,790 ตร.ม.
2. รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม ความยาว 683 ม.

รายการก่อสร้าง

1. ปรับปรุงถนน คสล.หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 5.30 - 8.00 ม. ยาว 588 ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,790 ตร.ม.
2. ก่อสร้างคู่อัดน้ำทาง ทน 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 5.30-8.00 ม. ยาว 350 ม.(Sta.0+00-Sta.0+350)หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.50 ม.หรือบ่อพักในผิวจราจร ความยาว 274 ม.
 - ท่อระบายน้ำ ϕ 0.50 ยาว 250 ม. จำนวน 24 ชุด
 - บ่อพัก (ลจ.รื้อ) ขนาด ϕ 0.50 จำนวน 24 ชุด
4. ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 ม.หรือบ่อพักในผิวจราจร ความยาว 409 ม.
 - บ่อพัก (ลจ.รื้อ) ขนาด ϕ 1.00 จำนวน 30 ชุด
 - บ่อพัก (ลจ.รื้อ) ขนาด ϕ 0.50 จำนวน 50 ชุด



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 13/2567
 2.4. 2566



ผู้ควบคุมก่อสร้าง
 สำนักรุกตัด
 (นางสาวอารีย์มาณี เชลลภ)



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 สำนักช่าง เทศบาลนครกรุงเทพมหานคร

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	แก้ไข

วิศวกร (นางสาวอารีย์มาณี เชลลภ) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	วิศวกร (นายสุวิทย์ ศรีสม) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
วิศวกร (นายประจักษ์ วัฒนกุล) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	วิศวกร (นายวิทย์ สุทธิ) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิภาดา อมต)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

SCALE 1:500

ต้นฉบับ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่างเทคนิคการก่อสร้าง

การแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	แก้ไข
1		
2		
3		
4		
5		

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)




ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

ชื่อ
(นายวิชากร สอน)




ชื่อ
(นายวิชากร สอน)

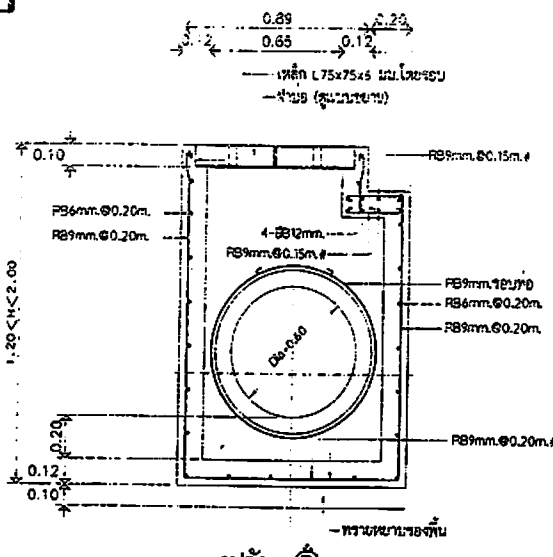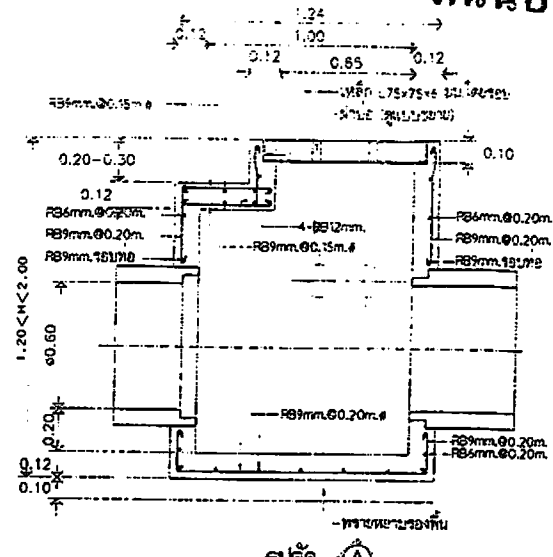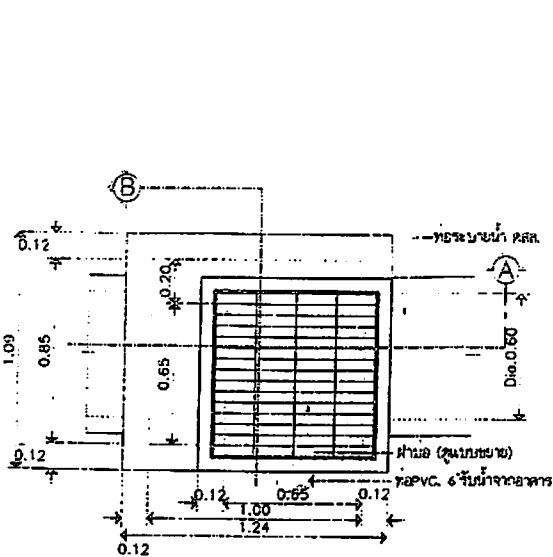

แปลนระบบระบายน้ำในผิวจราจร
SCALE 1:25


รูปตัด A
SCALE 1:25

รูปตัด B
SCALE 1:25

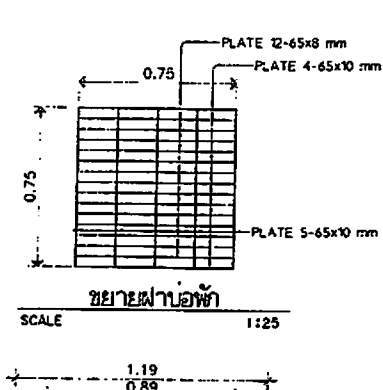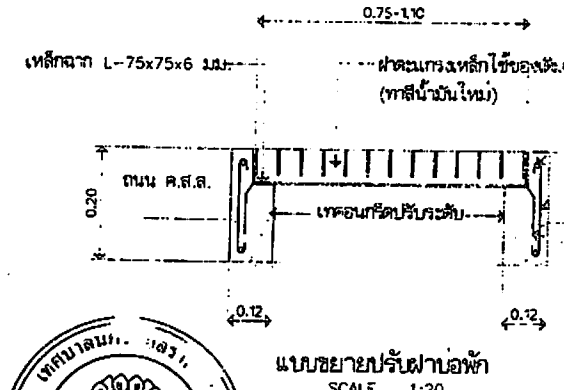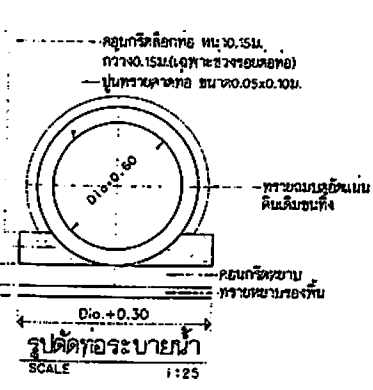

รายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการทั่วไป

1. วัสดุต่าง ๆ ในแบบก่อสร้างมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตโครงการมีขนาดเป็นแบบคอนกรีตแบบประเภที่ 1 สำหรับใช้รับน้ำหนัก
3. เหล็กเส้นใช้รับน้ำหนักใช้ขนาด 5x5x15 มม. ที่ยาว
4. วัสดุระบายน้ำขนาด 120-2549 ขนาดหน้า 3 (ลงชื่อ)
5. เหล็กเส้นคอนกรีตใช้ขนาด 5x5x15 มม. ขนาดหน้า 3 (ลงชื่อ)
6. เหล็กเส้นคอนกรีตใช้ขนาด 5x5x15 มม. ขนาดหน้า 3 (ลงชื่อ)
7. วัสดุระบายน้ำขนาด 120-2549 ขนาดหน้า 3 (ลงชื่อ)

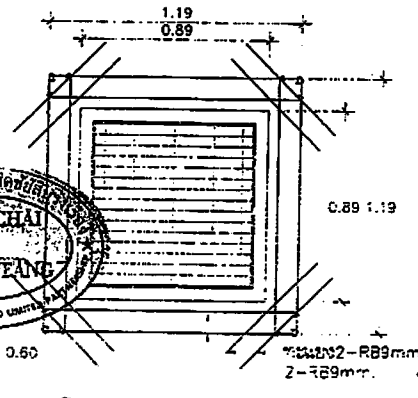

แบบขยายเหล็กเสริมรอบอ่ฟ้า
SCALE 1:25

สำเนาถูกต้อง







วันที่ 24 ต.ค. 2566

นางสาวอรพิน นิกิตการงาน

ชื่อ
(นางสาวอรพิน นิกิตการงาน)

ชื่อ
(นางสาวอรพิน นิกิตการงาน)

ต้นฉบับ

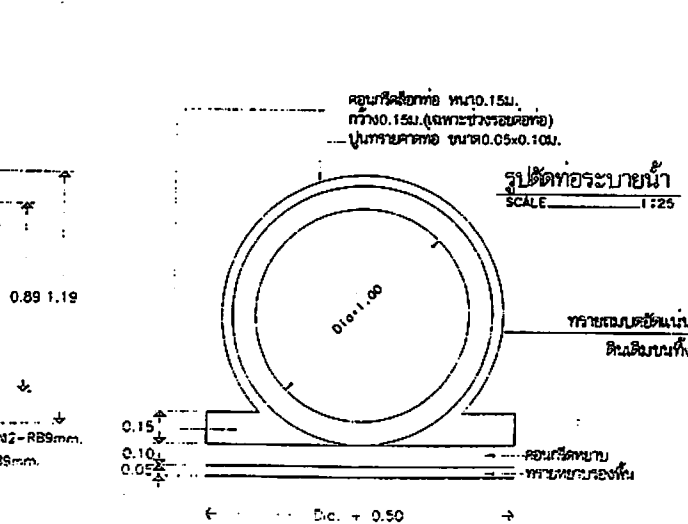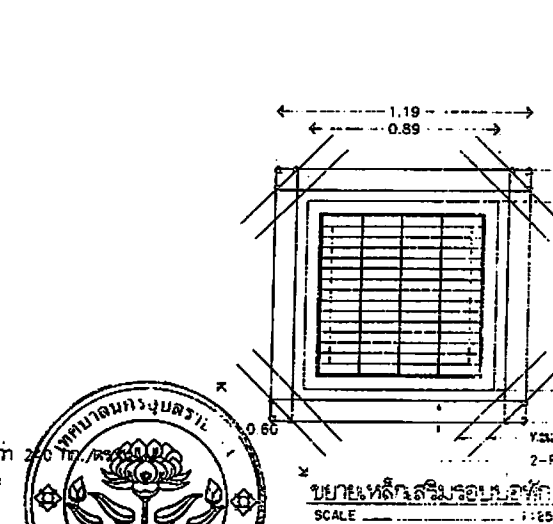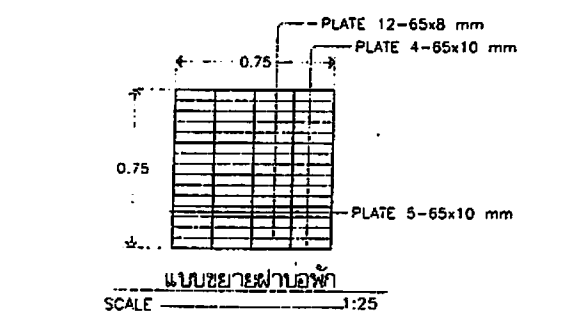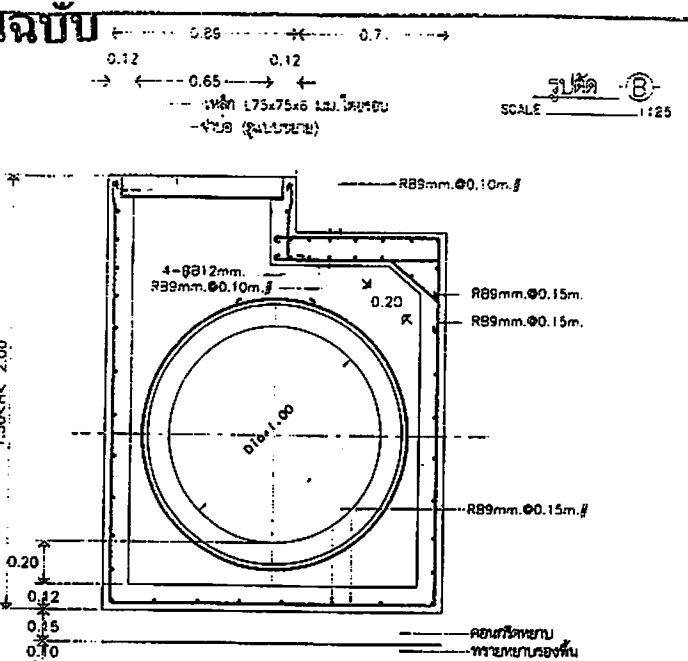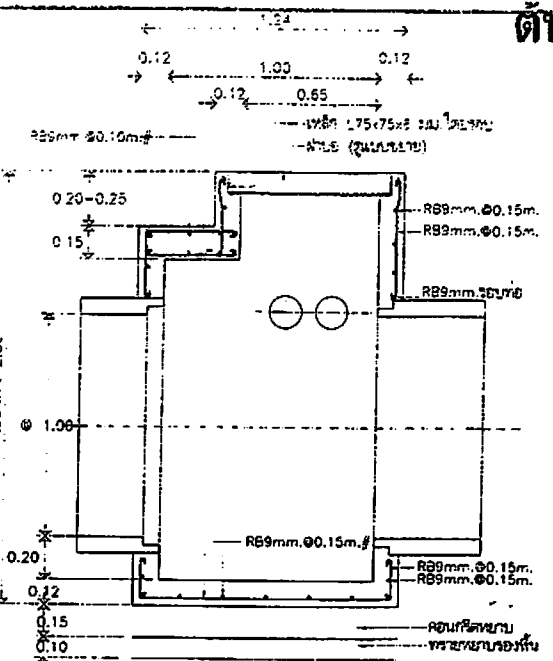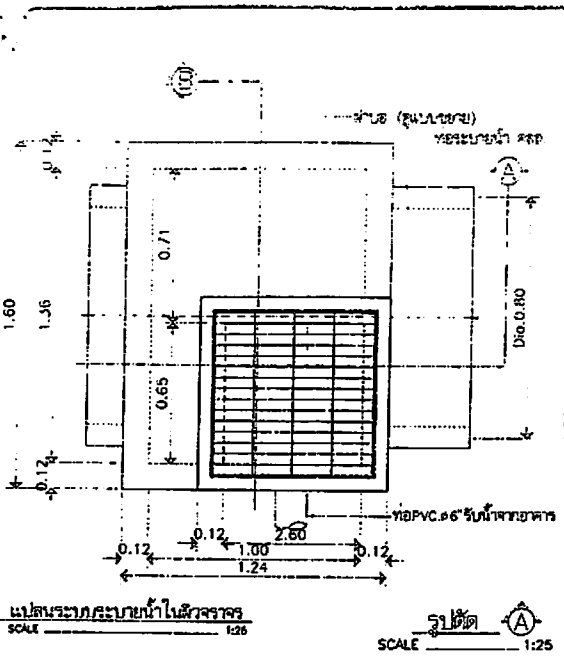

รายการประกอบแบบก่อสร้างโครงสร้างทั่วไป

- มีติดต่าง ที่ติดตั้งไว้ในแบบก่อสร้างมีหน้าบานเป็นเมตร นอกจากรูปเป็นอย่างไร
- คอนกรีตโครงสร้างผนังและคานเป็นแบบปัดขึ้นสนิมประเภทที่ 1 กาลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 200 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า) ส่วนของคานยาวคอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ยาว 28 ซม.)
- มวลรวมเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ให้เขียน (เห็นรูป)
- ท่อนระบายน้ำ สล. มาตรฐาน มอก.128-2549 สวมท่อนชั้น 3
- เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นลวดเหล็กปัดขึ้นสนิม SR24 มาตรฐาน มอก.20-2543 เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นลวดเหล็กปัดขึ้นสนิม SD40 มาตรฐาน มอก.24-2536. มอก.24-2537
- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน มอก.1221-2539 เหล็กทรงรี มาตรฐาน มอก.1221-2539 และเหล็กวงรี มาตรฐาน มอก.1221-2539
- กรณีใช้บานประตูบานหน้าต่างเป็นแบบก่อสร้าง ให้เขียนแบบก่อสร้าง และแสดงรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ชัดเจน
- เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่ถูกต้อง ให้นำแบบก่อสร้างที่ได้มาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมาพิจารณาเปรียบเทียบเป็นมาตรฐานไว้ ทั้งนี้ต้องยึดถือมาตรฐานแบบก่อสร้างในโครงการของสำนักงานฯ เป็นหลัก และไม่นับถือมาตรฐานของสำนักงานฯ



นายประสิทธิ์ สอนานนท์
SCALE 1:25

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยา.
(ลงชื่อ)



อำนาจศักดิ์
(นางสาวอรุณี นิลทอง)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	ผู้แก้ไข
1		
2		
3		
4		
5		

(นายวิไลภรณ์ นิลทอง)
หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้าง

(นายประสิทธิ์ สอนานนท์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

(นางสาวอรุณี นิลทอง)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

(นายประสิทธิ์ สอนานนท์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ สอนานนท์
วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ สอนานนท์
วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ สอนานนท์
วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ สอนานนท์
วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ สอนานนท์
วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

